Année Universitaire 2025/2026

PROJET TUTERÉ

NOTE DE CADRAGE

Outil de suivi du “Programme Ambassadeur”

ÉQUIPE PROJET

BOUAFOURA Ela
JAID Badr
SALVA Clément

COMMANDITAIRE

Service Communication
École d’ingénieur ISIS
Tuteur : Mr Charron

Date de remise : 23 janvier 2026

1.ANALYSE DU BESOIN

1.1 Contexte et Problématique

L'école ISIS s'appuie fortement sur l'implication de ses étudiants pour assurer sa promotion. Cependant, la gestion actuelle de ces actions est décentralisée et "artisanale" (utilisation dispersée d'emails, de tableaux Excel et de pages Notion).

Le problème majeur réside dans le manque de centralisation et de visibilité.

- **Pour le service communication** : il est difficile d'avoir une vision d'ensemble de "qui fait quoi" en temps réel. Le suivi est fragmenté, rendant le pilotage global du programme complexe.
- **Pour l'étudiant :** l'offre d'actions manque de lisibilité. Il est difficile pour un étudiant de savoir rapidement et simplement quelles sont les opportunités disponibles pour se mobiliser

Par ailleurs, la validation administrative des actions (comme pour les points "Ingénieur Engagé") souffre de ce manque de structure, rendant la collecte des preuves fastidieuse.

1.2 Objectifs du Projet

Ce projet ne vise pas uniquement à planifier des tâches, mais à fournir un véritable outil de pilotage de l'engagement étudiant.

Objectifs Principaux :

- **Centraliser l'ensemble des actions :** Créer un point d'entrée unique regroupant toutes les opportunités de promotion (Événements, Formations, Réseaux Sociaux).
- **Apporter Clarté et Lisible :** Offrir aux étudiants une interface claire pour consulter l'agenda et s'inscrire en quelques clics, favorisant ainsi leur mobilisation.
- **Offrir une Vision Globale (Pilotage) :** Permettre au service communication de visualiser instantanément l'activité (qui est inscrit où ?) et d'analyser les données via des statistiques précises.
- **Fiabiliser le processus (Validation) :** En conséquence de cette structuration, simplifier la validation des acquis grâce à un workflow rigoureux.

1.3 Public Cible et Bénéfices

Acteur	Rôle	Bénéfices Attendus
Service Communication	Utilisateur administrateur et Pilote	Vision d'ensemble immédiate. Pilotage par la donnée. Gain de temps administratif.
Étudiant Ambassadeur	Utilisateur Final	Lisibilité de l'offre. Simplification de l'inscription et accès centralisé aux

		ressources

1.4 Périmètre Fonctionnel

Pour l'Étudiant (Clarté et Action)

- Catalogue des actions : Agenda centralisé avec des filtres (date, type d'action …).
- Inscription simplifiée : Positionnement sur une action en quelques clics.
- Espace Ressources : Accès direct aux documents nécessaires (flyers, powerpoint).
- Suivi personnel : Vue "Mes actions" avec état d'avancement (Inscrit, En cours, Réalisé, Validé, Document déposé …).

Pour l'Administrateur (Pilotage et Suivi)

- Gestion du Programme : Création et modification des actions.
- Workflow de Validation : Réception des preuves de réalisation (fichier à uploader) et validation finale
- Module Statistique : Tableau de bord complet permettant de visualiser :
    - Le volume d'actions proposées
    - Le taux de remplissage des événements
    - Le nombre d'action réalisé par étudiant
    - La répartition des actions par catégories

Le tableau de bord n'est pas définitif, il peut évoluer selon les souhaits du client.

1.5 Formalisation du besoin

Diagramme Bête à corne

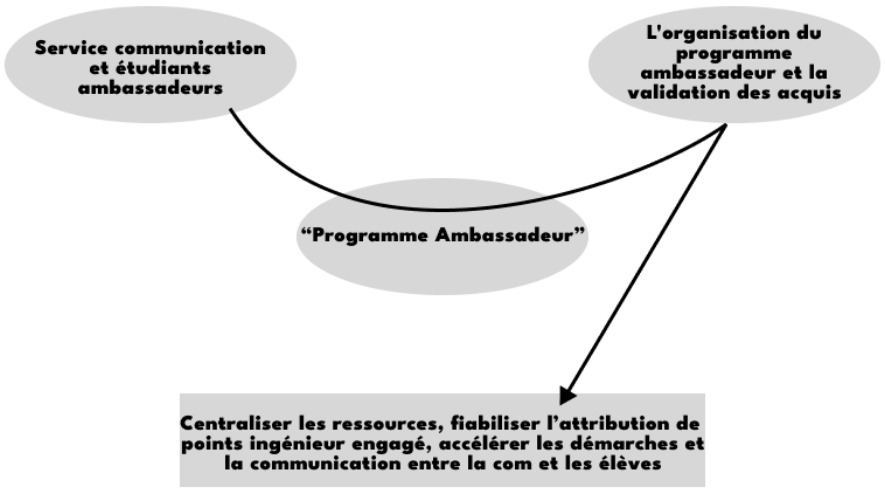

Diagramme pieuvre

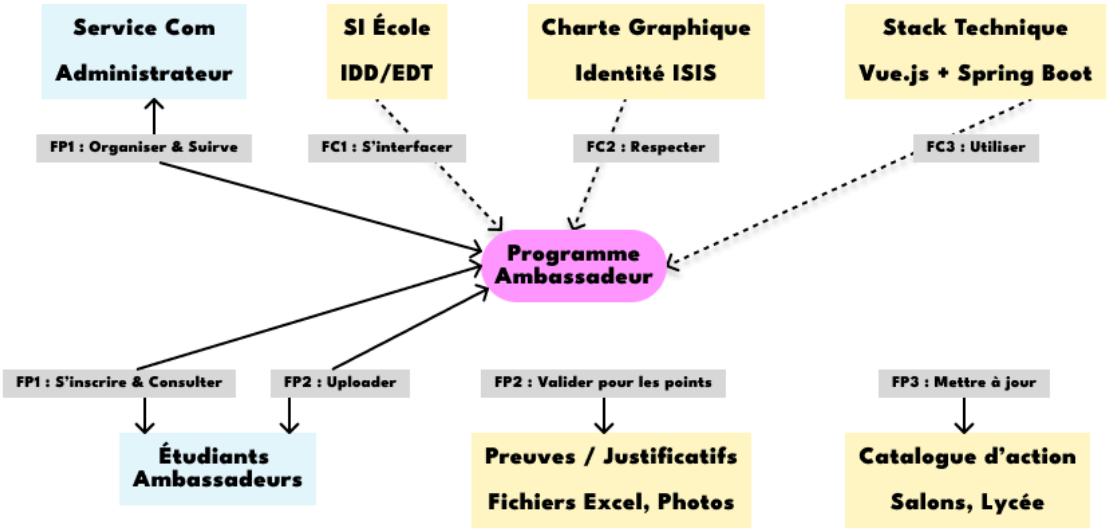

2. ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ

2.1 Résultats de la veille

Les solutions du marché (type *Ambassify* ou *Sociabble*) sont souvent surdimensionnées, coûteuses et orientées "Gamification". Elles ne répondent pas au besoin spécifique de gestion administrative académique (gestion stricte des preuves documentaires). Le développement sur-mesure est donc justifié pour coller au processus métier de l'école.

2.2 Analyse du contexte (Matrice SWOT)

Forces	Faiblesses
• Besoin interne très clairement défini • Équipe projet compétente et motivée • Synergie avec les cours suivis en parallèle permettant d'appliquer directement les meilleures pratiques techniques	• Dépendance forte aux données du SI de l'école pour l'EDT et l'IDD • Temps de développement limité par le cadre scolaire • Risque que certains utilisateurs soient mal à l'aise avec le nouvel outil
Opportunités	**Menaces**
• L'outil professionnalise l'image de ISIS et renforce sa présence marketing • Pérenniser le programme ambassadeur en le rendant encore plus sérieux et auditable • Créer un actif numérique réutilisable pour l'école	• Enjeu critique de la protection des données personnelles face aux failles de sécurité • Si l'expérience utilisateur (UX) est moins fluide qu'un simple e-mail, les étudiants pourraient contourner la plateforme • Risque de saturation de l'espace disque si trop d'étudiants téléversent simultanément des fichiers justificatifs volumineux

3. ÉTUDE DE FAISABILITÉ

3.1 Besoins Techniques et Fonctionnels

- **Stack Technique Imposée :** Fronted Vue.js / Backend Spring Boot.
- **Intégration SI :** Connexion aux annuaires de l'école pour l'authentification unique.
- **Planification (Roadmap) :**
  - Phase 1 : Socle technique et Authentification.
  - Phase 2 : Agenda, Gestion des Actions et Espaces Ressources
  - Phase 3 : Module Inscription et Upload de preuves.
  - Phase 4 : Dashboard Statistiques et Validation Admin.

3.2 Évaluation Financière (Estimation des coûts)

Bien que réalisé dans un cadre scolaire (aucun coût direct), la valorisation du projet est estimée comme cela :

- **Développement :** 282 heures cumulées (3 étudiants) x 35€/h = 90870 €.
- **Hébergement (VPS) :** environ 240 €/an
- **Budget Total :** environ 10 000 €

3.3 Synthèse de faisabilité

Critère	Évaluation	Justification

Stratégique	Très Forte	Répond au besoin critique de visibilité et d'organisation
Technique	Moyenne	Stack maîtrisé. Point de vigilance uniquement sur l'authentification IDD
Acceptabilité	Forte	Repose sur la praticité immédiate de l'outil et le gain de temps énorme généré par la centralisation (fin de la gestion par emails)

4. ANALYSE DES RISQUES

4.1 Matrice des Risques Principaux

Risque Identifié	Probabilité	Impact	Stratégie de Gestion
Difficultés de déploiement (Technique)	Fort	Fort	Tester le déploiement sur le serveur dès le début du projet (pas à la fin) pour identifier les problèmes au plus tôt
Fichiers preuves inexploitables (Usage)	Forte	Moyen	Gabarits obligatoires fournis dans l'Espace Ressources
Interface Admin complexe (Adoption)	Faible	Moyen	Co-conception des maquettes avec le service communication dès le début du projet (besoin de leur aval pour avancer)

4.2 Conditions d'achèvement

Le projet sera considéré comme achevé une fois le déploiement effectué sur le serveur de l'école, la formation du Service Communication réalisée, et la validation du module statistique permettant le reporting annuel.
